



VERIFICA: LA INFORMACIÓN REGISTRADA POR LA ENTIDAD

## Ficha resumen de la obra

(D)

Galería

Agregar comentarios

Búsqueda avanzada ([wfm\\_obras\\_buscadore.aspx](#))

INFOMAPA ([wfm\\_mapa3.aspx](#))

### 1. Datos generales

**ENTIDAD**

INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLÁSICAS

**NOMBRE DE LA OBRA**

031557 - MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE RESPUESTA EN EL TRATAMIENTO AMBULATORIO DEL CANCER DEL INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS

**MODALIDAD DE EJECUCIÓN**

POR CONTRATA

**FECHA DE INICIO DE OBRA**

01/08/2017

**UBICACIÓN DE LA OBRA**

AV. ANGAMOS ESTE N° 2520  
LIMA - LIMA - SURQUILLO

**CONTRATISTA**

CONSORCIO ITALO PERAUNO

**SUPERVISOR**

BENAVIDES DIAZ RICARDO FRANCISCO

**RESIDENTE**

RICARDO FRANCISCO, BENAVIDES DIAZ  
DNI: 08848048

ESTADO DE LA OBRA

EJECUCIÓN

MONTO DE CONTRATO EN S/.

270,604,180.65

TIEMPO EN EJECUCIÓN

630 días

18.87 %

AVANCE FINANCIERO EJECUTADO

3,646,065.10

FECHA DE FINALIZACIÓN DE OBRA


23/04/2019 ⓘ

## 2. Fotos y Ubicación


Inicio de obra



Actualizado al 28/09/2018

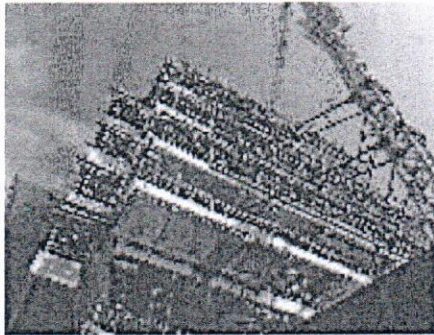

Ubicación en mapa



## 3. Datos técnicos de la obra

Expediente técnico de la obra	Proyecto de inversión Pública	Línea de tiempo	Pagos Contractuales	Avance Físico Financiero	Obras de mantenimiento
-------------------------------	-------------------------------	-----------------	---------------------	--------------------------	------------------------



**Avance Físico Real 18.87 %  
Actualizado a agosto 2018**

<b>24/06/2014</b> Aprobación del proyecto S/ 277,993,156.00 ( <a href="http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&amp;txtCodigo=143957">http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&amp;txtCodigo=143957</a> )	
<b>24/06/2014</b> Verificación del proyecto S/ 277,993,156.00 ( <a href="http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&amp;txtCodigo=143957">http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&amp;txtCodigo=143957</a> )	
<b>Expedientes de obra</b>	<b>Inicio de obra</b>
<b>03/07/2017</b> Expediente 1 S/ 270,604,180.65 ( <a href="docs/expediente/documento20170925194525.pdf">docs/expediente/documento20170925194525.pdf</a> )	
<b>01/08/2017</b> Inicio de Obra	
<b>Ejecución Avances de obra</b>	
<b>01/2018</b> Avance 1 S/ 3.41 ( <a href="wfm_segobras_usu_ver_1.aspx?ID=Trfkj&amp;IDSegObra=Vgghl'&amp;buscar=&amp;tipo=5">wfm_segobras_usu_ver_1.aspx?ID=Trfkj&amp;IDSegObra=Vgghl'&amp;buscar=&amp;tipo=5</a> )	
<b>03/2018</b> Avance 2 S/ 9,494,616.10 ( <a href="wfm_segobras_usu_ver_1.aspx?ID=Trfkj&amp;IDSegObra=Vhkkg'™&amp;buscar=&amp;tipo=5">wfm_segobras_usu_ver_1.aspx?ID=Trfkj&amp;IDSegObra=Vhkkg'™&amp;buscar=&amp;tipo=5</a> )	
<b>04/2018</b> Avance 3 S/ 2,401,773.20 ( <a href="wfm_segobras_usu_ver_1.aspx?ID=Trfkj&amp;IDSegObra=Vhlmj'™&amp;buscar=&amp;tipo=5">wfm_segobras_usu_ver_1.aspx?ID=Trfkj&amp;IDSegObra=Vhlmj'™&amp;buscar=&amp;tipo=5</a> )	
<b>05/2018</b> Avance 4 S/ 2,942,838.40 ( <a href="wfm_segobras_usu_ver_1.aspx?ID=Trfkj&amp;IDSegObra=Vlfj'—&amp;buscar=&amp;tipo=5">wfm_segobras_usu_ver_1.aspx?ID=Trfkj&amp;IDSegObra=Vlfj'—&amp;buscar=&amp;tipo=5</a> )	
<b>06/2018</b> Avance 5 S/ 7,615,538.68 ( <a href="wfm_segobras_usu_ver_1.aspx?ID=Trfkj&amp;IDSegObra=Vilml3&amp;buscar=&amp;tipo=5">wfm_segobras_usu_ver_1.aspx?ID=Trfkj&amp;IDSegObra=Vilml3&amp;buscar=&amp;tipo=5</a> )	
<b>07/2018</b> Avance 6 S/ 3,501,239.73 ( <a href="wfm_segobras_usu_ver_1.aspx?ID=Trfkj&amp;IDSegObra=Vjjj'&amp;buscar=&amp;tipo=5">wfm_segobras_usu_ver_1.aspx?ID=Trfkj&amp;IDSegObra=Vjjj'&amp;buscar=&amp;tipo=5</a> )	
<b>08/2018</b> Avance 7 S/ 3,646,065.10 ( <a href="wfm_segobras_usu_ver_1.aspx?ID=Trfkj&amp;IDSegObra=Vkffd'&amp;buscar=&amp;tipo=5">wfm_segobras_usu_ver_1.aspx?ID=Trfkj&amp;IDSegObra=Vkffd'&amp;buscar=&amp;tipo=5</a> )	

#### 4. Información complementaria

Adelantos	Calendario	Ampliaciones	Adicionales	Procesos Arbitrales		
N°	Tipo de adelanto	N° de documento	Fch. de aprob documento	Por. de aprobación	Monto	Documento
001	ADELANTO DE COMPRA DE MATERIALES	305-2018-SG/INEN	20/07/2018	16%	S/ 22,151,541.10	<a href="docs/Adelanto/documento20180801131801.pdf">Ver (docs/Adelanto/documento20180801131801.pdf)</a>
002	ADELANTO DE COMPRA DE MATERIALES	220-2018-SG-INEN	07/06/2018	8.50%	S/ 8,312,909.87	<a href="docs/Adelanto/documento20180702095039.pdf">Ver (docs/Adelanto/documento20180702095039.pdf)</a>
003	ADELANTO DE COMPRA DE MATERIALES	MEMORANDO N° 1550-2017-OGA/INEN	30/10/2017	15%	S/ 14,978,897.67	<a href="docs/Adelanto/documento20180517184353.pdf">Ver (docs/Adelanto/documento20180517184353.pdf)</a>
004	ADELANTO DIRECTO	3697-2015-OL-OGA-INEN	28/12/2015	20%	S/ 50,550,324.60	<a href="docs/Adelanto/documento20180517180641.pdf">Ver (docs/Adelanto/documento20180517180641.pdf)</a>

#### 5. Informes de control relacionados a la obra

Tipo Informe	N° de Informe	Asunto	Fecha Emisión de Informe	Fecha Publicación de Informe	Resumen Ejecutivo	Informe
ACCIÓN SIMULTÁNEA	615-2018-CG/L316-AS	INFORME DE ACCIÓN SIMULTÁNEA AL INEN	25/06/2018 12:00:00 a.m.	21/09/2018 05:28:40 p.m.	 ( <a href="http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2018CSIL31600006&amp;TIPOARCHIVO=RE">http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2018CSIL31600006&amp;TIPOARCHIVO=RE</a> )	 ( <a href="http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2018CSIL31600006&amp;TIPOARCHIVO=ADJUNTO">http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2018CSIL31600006&amp;TIPOARCHIVO=ADJUNTO</a> )

Visitas del día:  
**6,292**

